

Auftrag zur Sanierung eines Trinkwasser-Hausanschlusses



Auftraggeber (Rechnungsadresse)

Name, Vorname

Telefon

.....

.....

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

.....

.....

für mein Grundstück

Straße, Haus-Nr.

Flurstück-Nr.

.....

.....

in Sigmaringen ist ein Trinkwasser-Hausanschluss zu sanieren.

Die aufgeführten Kosten beinhalten nicht den Wasserversorgungsbeitrag lt. Wasserversorgungssatzung der Stadt Sigmaringen.

Ich beauftrage hiermit die Stadtwerke Sigmaringen mit der Verlegung des Trinkwasser-Hausanschlusses. Die Stadtwerke Sigmaringen können sich dabei Fremdfirmen bedienen.

Die Kosten werden pauschal abgerechnet.

Angebot

Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
	Wasser-Hausanschluss einschließlich aller Tiefbauarbeiten bis 5 Meter	935,00 €	
	Zuschlag für Mehrlänge, pro Meter	108,00 €	
	Wasser-Hausanschluss im gemeinsamen Graben mit Gas-HA bis 5 Meter	495,00 €	
	Zuschlag für Mehrlänge, pro Meter	54,00 €	
	Wasser-Hausanschluss ohne Tiefbauarbeiten und ohne Mauerdurchbruch bis 5 Meter	280,00 €	
	Zuschlag für Mehrlänge, pro Meter	19,00 €	
	Gesamtsumme inkl. MwSt.		

Die gesamten Preise verstehen sich inklusive der gültigen Mehrwertsteuer von z.Zt. 7%.

Die beauftragten Kosten beinhalten einen Lohnanteil von 50%.

Der Pauschalpreis bezieht sich auf eine Leistung mit durchschnittlichem Aufwand (Bodenklasse 3, Wiederherstellung der Bepflanzung bzw. Bitumenbelag).

Für einen darüber hinaus gehenden Aufwand wird ein separates Angebot erstellt.

Die Pauschale beinhaltet keine Kosten für Arbeiten in der Hausinstallation.

Datum

Unterschrift Auftraggeber

.....

.....

Anschrift Technisches Büro
72488 Sigmaringen
Badstraße 28

Telefon/Telefax
Tel. (07571) 106-201
Fax (07571) 106-160

e-mail
Technisches-Buero@sigmaringen.de


Für Tiefbauarbeiten in Eigenleistung im Bereich des eigenen Grundstücks sind folgende Maße einzuhalten:

Rohrgraben	Breite:	0,40 m – 0,60 m
	Tiefe:	ca. 1,50 m
Sandbettung		0,15 m auf die gesamte Länge
Kopfloch am Gebäude	Länge:	1,50 m
	Breite:	beidseitig der Zuleitung 0,60 m
	Tiefe:	0,30 m unter Mauerdurchbruch
Mauerdurchbruch		ca. 10 cm Durchmesser mit mindestens 40 cm Abstand von anderen Leitungen und mindestens 20 cm Abstand von Wänden

Anschließend an die Rohrverlegung ist die Hauseinführung sofort fachgerecht gegen eindringendes Wasser abzudichten, die Wasserleitung sofort mit 30 cm Überdeckung einzusanden und der Graben mit feinem Erdreich zu verfüllen.

Unsere Monteure sind angewiesen, den Hausanschluss erst dann zu verlegen, wenn der Rohrgraben die vorstehenden Forderungen bzw. hiervon abweichende, örtliche Anweisungen unserer Bauleitung erfüllt.

Verlegeskizze

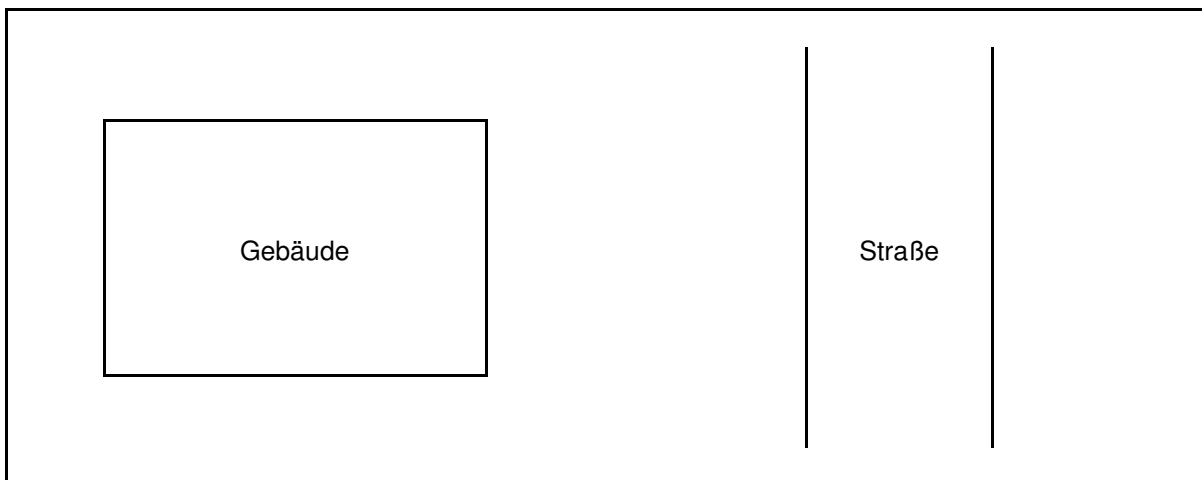

Lfd. Nr.:

Datum:

Ausführung genehmigt:

.....

Anschrift Technisches Büro
72488 Sigmaringen
Badstraße 28

Telefon/Telefax
Tel. (07571) 106-201
Fax (07571) 106-160

e-mail
Technisches-Buero@sigmaringen.de
