

# Auftrag zur Neuverlegung eines Erdgas- Hausanschlusses

## Auftraggeber (Rechnungsadresse)

Name, Vorname

Telefon (bitte immer angeben)

.....  
Straße, Haus-Nr.

.....  
PLZ, Ort

## für mein Grundstück

.....  
Straße, Haus-Nr.

.....  
Flurstück-Nr.

### die Herstellung eines Erdgas-Hausanschlusses für die Versorgung des benannten Gebäudes:

(bitte kreuzen Sie an und ergänzen Sie)

- Wohngebäude mit ..... Wohneinheiten, .....m<sup>2</sup>, Nennwärmebelastung von voraussichtlich .....kW  
 Gewerbebetrieb mit ..... Wohneinheiten, .....m<sup>2</sup>, Nennwärmebelastung von voraussichtlich ..... kW

### Der Erdgas-Hausanschluss soll in

- ein bestehendes Gebäude     einen Neubau     bis zum ..... verlegt werden.

Die Kosten werden pauschal ermittelt. Die Mehrlängen werden nach tatsächlicher Leitungslänge abgerechnet.

## Angebot

Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
	<b>Erdgas-Hausanschluss inklusive aller Tiefbauarbeiten bis 15 Meter</b> (gemessen ab Straßenmitte) DN 50, Mauerdurchbruch, Abdichtung, Inbetriebsetzung für 1 Gaszähler Größe G 25	1.935,00 €	
	<b>Zuschlag für Mehrlänge</b> , pro Meter	79,00 €	
	<b>Erdgas-Hausanschluss ohne Tiefbauarbeiten bis 15 Meter</b> ohne Mauerdurchbruch, * Tiefbauarbeiten durch den Grundstückseigentümer nach den Regeln der Technik	703,00 €	
	<b>Zuschlag für Mehrlänge</b> , pro Meter	34,00 €	
	<b>Erdgas-Hausanschluss während der Verlegung der Hauptleitung bis 15 Meter</b> DN 50, Mauerdurchbruch, Abdichtung, Inbetriebsetzung für 1 Gaszähler Größe G 25	1.366,00 €	
	Gesamtsumme inkl. MwSt.		

\*) Tiefbauarbeiten im öffentlichen Bereich müssen bis zur Versorgungsleitung von einer von der Stadt Sigmaringen zugelassenen Tiefbaufirma im Auftrag des Kunden durchgeführt werden. Die Kosten hierfür werden direkt von der Tiefbaufirma an den Kunden berechnet.

Die gesamten Preise verstehen sich inklusive der gültigen Mehrwertsteuer von z.Zt. 19%.  
Die beauftragten Kosten beinhalten einen Lohnanteil von 50%.

Der Pauschalpreis bezieht sich auf eine Leistung mit durchschnittlichem Aufwand (Bodenklasse 3, Wiederherstellung der Bepflanzung bzw. Bitumenbelag).

Für einen darüber hinaus gehenden Aufwand wird auf Nachweis zusätzlich abgerechnet.

Die Pauschale beinhaltet keine Kosten für Arbeiten in der Hausinstallation.

Das Gasversorgungsunternehmen ist nur dann zur Ausführung verpflichtet, wenn eine genügende Anzahl von Bestellungen vorliegt und die erforderlichen Versorgungsleitungen verlegt sind. Die Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) ist Bestandteil des Auftrages und wird hiermit zur Kenntnis genommen. Eine Ausfertigung wird auf Wunsch zugesandt bzw. ist über [www.stadtwerke-sigmaringen.de](http://www.stadtwerke-sigmaringen.de) einzusehen.

Datum

Unterschrift des Grundstückseigentümers  
(falls dieser nicht selbst Auftraggeber ist)

Unterschrift des Auftraggebers

**Für Tiefbauarbeiten in Eigenleistung bzw. im Auftrag des Grundstückseigentümers im Bereich des eigenen Grundstücks sind folgende Maße einzuhalten:**


Rohrgraben	Breite: 0,40 m – 0,60 m Tiefe: ca. 0,80 – 1,20 m
Sandbettung	0,15 m auf die gesamte Länge
Kopfloch am Gebäude	Länge: 1,50 m Breite: beidseitig der Zuleitung 0,60 m Tiefe: 0,30 m unter Mauerdurchbruch
Mauerdurchbruch	100 mm Durchmesser mit mindestens 40 cm Abstand von anderen Leitungen und mindestens 20 cm Abstand von Wänden

Die verlegten Leerrohre / Leitungen sind für die Aufnahme in die Netzdokumentation am offenen Graben durch die Stadtwerke Sigmaringen ein zu messen. Bei verfüllten Leitungsgräben sind diese zu Lasten des Auftraggebers wieder auf zu graben.

Anschließend an die Rohrverlegung ist die Hauseinführung sofort fachgerecht gegen eindringendes Wasser abzudichten, die Gasleitung sofort mit 30 cm Überdeckung einzusanden und der Graben mit feinem Erdreich zu verfüllen.

Unsere Monteure sind angewiesen, den Hausanschluss erst dann zu verlegen, wenn der Rohrgraben die vorstehenden Forderungen bzw. hiervon abweichende, örtliche Anweisungen unserer Bauleitung erfüllt.

**Verlegeskizze**

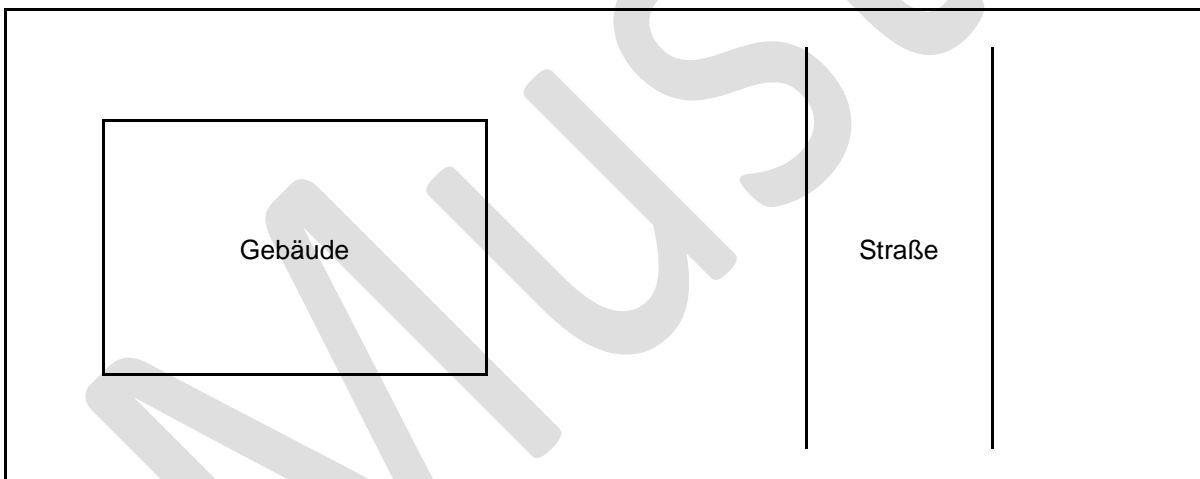

Lfd. Nr.:

Datum:

Ausführung genehmigt:
