Stadtwerke Sigmaringen GmbH | Marie-Curie-Straße 8 | 72488 Sigmaringen

An die Bewohner des Hauses

Ihr persönlicher Kontakt:
Yannick Ritter
Bauleitung Tiefbau
Telefon 07571 92770-252
y.ritter@stadtwerke-sigmaringen.de

Information zum Ausbau des Nahwärmenetzes im Wohngebiet „Am Riedbaum“

15. Juli 2026

Sehr geehrte Anwohnerin,
sehr geehrter Anwohner,

der Ausbau des Nahwärmenetzes im Wohngebiet „Am Riedbaum“ schreitet weiter voran. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den aktuellen Stand der Arbeiten sowie die nächsten Bauabschnitte informieren und Ihnen einen Ausblick auf den weiteren Ablauf geben.

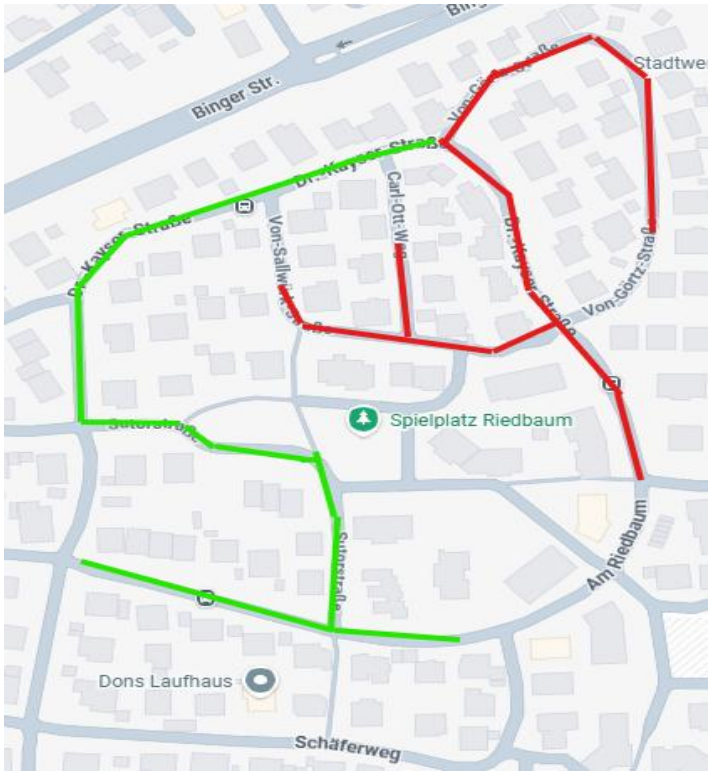

Übersicht der Bauabschnitte: Rot = aktuelle Inbetriebnahme | Grün = weiterer Ausbau

Aktueller Stand und Inbetriebnahme
Im rot markierten Bereich wird das Nahwärmenetz derzeit für die Inbetriebnahme vorbereitet. Die hierfür erforderlichen Arbeiten werden nach aktuellem Stand voraussichtlich innerhalb der kommenden zwei Wochen abgeschlossen sein.

Einbau der Hausübergabestation
Ab August beginnt die von den Stadtwerken Sigmaringen beauftragte Monteurfirma Frank Hein (Telefon 07575 3347) nach vorheriger Terminabstimmung mit dem Einbau der Hausübergabestationen in den jeweiligen Gebäuden. Die betroffenen Anschlussnehmer werden hierzu rechtzeitig kontaktiert, um einen individuellen Montagetermin zu vereinbaren.
Nach dem Einbau der Hausübergabestation kann Ihr Heizungsinstallateur die erforderlichen Arbeiten an Ihrer Heizungsanlage durchführen und die Verbindung zur neuen Nahwärmeversorgung herstellen. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass ab Oktober mit der Anbindung der Hausanlagen begonnen werden kann.

Weiterer Baufortschritt
Momentan wird an den Leitungen in der Dr.-Kayser-Straße im Bereich der Kreuzung Von-Sallwürk-Straße / Carl-Ott-Weg gearbeitet.
Der derzeit in Ausführung befindliche Leitungsabschnitt wird bis zur Kreuzung Sutorstraße fertiggestellt. Dort wird ein Schieberbauwerk errichtet, das für den weiteren Netzbetrieb erforderlich ist. Nach Abschluss dieser Arbeiten kann auch dieser Leitungsabschnitt an das bestehende Nahwärmenetz angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Nach aktuellem Stand ist dies voraussichtlich ab Mitte September möglich, die Firma Frank Hein wird sich dann auch hierzu mit den betroffenen Anschlussnehmern in Verbindung setzen.
Anschließend werden die Arbeiten in der Sutorstraße sowie in den noch ausstehenden Bereichen der Straße „Am Riedbaum“ fortgesetzt (grün markierter Bereich).

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Geduld während der Bauarbeiten. Mit dem Ausbau des Nahwärmenetzes schaffen wir eine zukunftssichere Wärmeversorgung für das Wohngebiet.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Stadtwerke Sigmaringen GmbH

Terminübersicht

Zeitraum	Maßnahme
Bis Ende Juli 2026	Abschluss der Vorbereitungsarbeiten im rot markierten Bereich und Inbetriebnahme dieses Netzabschnitts.
Ab August 2026	Einbau der Hausübergabestationen durch die Firma Frank Hein nach vorheriger Terminvereinbarung mit den Anschlussnehmern.
Ab Mitte September 2026 (voraussichtlich)	Inbetriebnahme des Leitungsabschnitts bis zur Kreuzung Sutorstraße. Anschließend Terminvereinbarung und Einbau der Hausübergabestationen in diesem Bereich.
Ab Oktober 2026 (voraussichtlich)	Beginn der Anbindung der Hausanlagen an das Nahwärmenetz durch den jeweiligen Heizungsinstallateur.
Anschließend	Fortsetzung der Bauarbeiten in der Sutorstraße sowie in den noch ausstehenden Bereichen der Straße „Am Riedbaum" (grün markierter Bereich).

Hinweis: Bitte beauftragen Sie Ihren Heizungsinstallateur erst verbindlich, nachdem der Termin für den Einbau Ihrer Hausübergabestation festgelegt wurde. Dadurch können die Arbeiten optimal aufeinander abgestimmt und unnötige Wartezeiten vermieden werden.
